

# वार्षिक प्रगति

आ. व. २०७१/०७२

जिल्ला विकास समिति

बागलुङ

# कार्यक्रमको सारांश

## बागलुङ जिल्ला



# जिविस तर्फ

जम्मा आयोजना संख्या – ६२९


प्रगति भएका आयोजना संख्या - ५९३

सम्पन्न हुन नसकेका जम्मा योजना संख्या - ३६

६ वटा आयोजना फ्रिज

३० वटा क्रमागत यसवर्ष गरिने

## आयोजनागत प्रगति

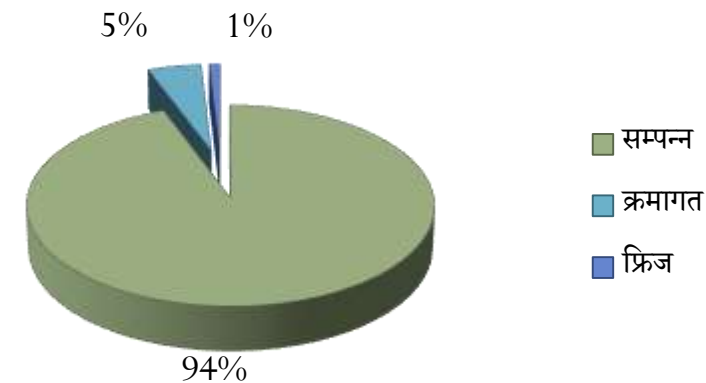

## गाविस तर्फ

५९ गा.वि.स मा १३३९ योजना संख्या,

विनियोजित रकम रु. ६७२७० (हजारमा) संचालन भएका

सबै खर्च भएको

# वार्षिक बजेट सारांश

क्र. सं.	बजेट शिर्षक	जम्मा बिनियोजन	चालु तर्फ बजेट रु हजारमा		पूँजिगत तर्फ बजेट रु हजारमा		जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
			बिनियोजन	खर्च	बिनियोजन	खर्च		
१	निशर्त अनुदान(सा.सु समेत)	१७५३३६	४३४२९	४०८९३	१३१९०७	१२४१६१	१८०४८२	९४.१
२	शशर्त अनुदान	२७५७१०	२२५४१९	१९७३८२	५०२९१	१५५३२	२१२९१४	७७.२२
३	राजश्व अनुदान (मालपोत र. बिधुत रोयल्टि समेत)	५४८५२	-	२०००	-	२५८५२	२७८५२	५०.७७
४	आन्तरिक आय	७४४३	६५००	४८६८	९४३	४५०	७४४३	७१.४४

# समग्र वित्तीय प्रगति ८१.७ %

	निकासा बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
जिविस तर्फ (पश्चिम नेपाल, LGCDP सहित)	५२६०५८	४५०४४८	८५.६	
वातावरण ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम तर्फ	६९२०	५९३६	८५.७८	
DRILP तर्फ	१३५७६२	९००६५	६६.३४	
जम्मा	६६८७४०	५४६४४९	८१.७	

## मुख्य कार्यहरु

- ✓ पूर्ण सरसफाइ युक्त जिल्ला बनाउने कार्य अभियानको रुपमा शुरु भएको ।
- ✓ ७ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण, लम्बाइ ४१३ मि। आ.व ०७०/७१ सम्म झोलुङ्गे पुल सङ्ख्या ५००, लम्बाइ १९०२४ मि, आ.व ०७१/७२ सम्म कुल जम्मा झो. पुल सङ्ख्या ५०७ र लम्बाइ १९४३७ मि. ।
- ✓ ६ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणाधिन ।
- ✓ ७१ किमि नयाँ ट्रयाक थपा आ.व ०७०/७१ सम्म सडक ७९७ किमि । कुल जम्मा ८६८ किमि (जिल्ला र गाउ सडक), सवारि चलन सक्ने लम्बाइ ७७१ किमि । सडक सङ्ख्या ६५ । भुगोलको पहुँच क्षेत्र २९% बाट ३५% पुगेको ।
- ✓ ३५ हेक्टरमा थप सिचाइ सुबिधा पुगेको । ३५ किमि थप पाइपलाइन बिस्तार करिव १५००० जनसंख्या लाभान्वित ।
- ✓ सडक संजलमा नजोडिएको बोंगादोभान, सडक संजालले जोडिएको र सुखौरा, सल्यान, छिस्ती, खुडखानी, तमान गाविस समेतलाई छिट्टै संजाल संग जोड्ने काम उल्लेखनीय रुपमा अगाडि बढेको ।

- ✓ गतवर्षको तुलनामा आ. व. (०७०/७१) मा गाबिसहरू MCPM मा उत्तीण हुने संख्या बढेको ।
- ✓ विगतमा एकपटक पनि खानेपानी योजना संचालन नभएका दुर्गम क्षेत्रमा खानेपानी पहुँच बढाइएको ।
- ✓ DTMP लाइ आधार मानि सडक नजोडिएका गाविस बाहेक अन्य गाविसमा ट्रयाक खोल्ने कार्यलाइ निरुत्साहित गरि भइरहेका सडकको स्तरोन्नतीमा ध्यान केन्द्रित गरिएको ।
- ✓ गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयवाट २ वटा सडक पुल निर्माण कार्यको ठेक्का भएकोमा १ वटा मोटरेवल पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

# भौतिक तर्फको केहि मुख्य उपलब्धीहरु

क्र.स.	लगानिको क्षेत्र	ईकाई	निर्माण सम्पन्न	निर्माणाधिन	खर्च रु हजारमा
१	कच्ची सडक	कि.मि.	७१.२३		३९५६०
	ग्याविन लागाउने कार्य	घ.मि.	६९५		२४८५
	कच्ची नाली	कि.मि	१.७४		१६१
	सोलिड, ग्राभेलिड, पहिरो सफा गर्ने, मोड सुधार	कि.मि	२४.७१		१२४२४
२	झोलुङ्गे पुल बृहत मर्मत	वटा	७	३	८२८४
	झोलुङ्गे पुल सामान्य मर्मत	वटा	३७		३०१
३	सडक पुल	वटा		२	९७४८



# भौतिक तर्फको केहि मुख्य उपलब्धीहरु

क्र.स.	लगानिको क्षेत्र	ईकाई	निर्माण सम्पन्न	निर्माणाधिन	खर्च रु हजारमा
४	खानेपानी योजना				
	टंकि निर्माण	गोटा	१३		१३०५
	विपिटि,सिसि	गोटा	३		१२६
	धारा निर्माण	गोटा	५४		७७५
	ईन्टेक, अन्य	गोटा	१५०		५८९७
	पाइपलाइन बिस्तार	कि. मी.	३५.४१		६५५५
५	सिचाइ	हेक्टर	३५		७११२
६	शौचालय निर्माण	वटा	१२	३	१००८
७	भवन निर्माण	वटा	६४		१३२६०
८	ग्रमिण विधुतिकरणसुधार विस्तार (पोल)	गोटा	९५१		११४५४

# शिर्षकगत भौतिक प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम तथा परियोजनाको नाम	भौतिक प्रगति				खर्च	अनुमानित लाभान्वित जनसंख्या
		मुख्य गतिविधी	ईकाई	लक्ष्य	प्रगति		
१	जिबिस अनुदान (गरिबसँग विश्वेश्वर, कवाडी अनुदान, निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम समेत)	समपुरक कोष, लक्षित बर्ग कार्यक्रम, योजना तर्जुमा, पर्यटन पुर्वाधार बिकास, खेलकुद क्षेत्र बिकास, दैबि प्रकोप ब्यवस्थान, सडक निर्माण, मर्मत बिभिन्न सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयसंग साझेदारि, जटिल रोग उपचार, साहित्य कला संस्कृती सम्बन्धि कार्यक्रम आदि	संख्या	१६२	१५९	१४२७४	३३०००
२	केन्द्रिय अनुदान (लक्षित समुह-दलित, जनजाती, मुस्लिम)	आयमुलक सिपमुलक तालिम र ससक्तीकरण कार्यक्रम	संख्या	४	३	४०९	१८०
३	आन्तरिक श्रोत	महिला उमेद्वारको लागि लोकसेवा तयारि कक्षा, आरन सुधार, बाल सहयोग तथा बालमैत्री कार्यक्रम	संख्या	१०	१०	३४०	७४०
४	ग्रामिण खा.पा. तथा सरसफाइ कार्यक्रम	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खा.पा लाई म्याचिड, खानेपानी योजना निर्माण, शौचालय निर्माण, सरसफाइ तालिम, मर्मत सम्भार र खा.पा मर्मतको लागि पाइप खरिद आदि	संख्या	३७	३७	५६३९	१५५६०

# शुषकगत भौतिक प्रगतल

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा परलरुोजनाको नाम	भौतिक प्रगतल				खर्च	अनुमानलत ललभलनवलत जनसंखुया
		मुखुय गतलवलधी	ईकाई	लक्षुय	प्रगतल		
ॡ	स्थलनलय यलतलयात पूर्वलधलर तथा क्षेत्रगत कार्यक्रम(कृषल सडक)	ग्रलमलण सडक नलरुमलण, मरुमत, सुधलर, बलसुतलर मरुमत कोष मुयाकलड फणुड, मोटेरेबल पुल	संखुया	२७	२७	१ॡॢ१ॢ	२७७००
ॢ	सलनल सलंचलड तथा नदी नलरुयनुन्रण कार्यक्रम	सलंचलड कुलो मरुमत, सुधलर तथा नयलँ नलरुमलण, पलडप खरलद, तलरजलली खरलद र वलतरण	संखुया	७	७	७१३१	ॡ२१०
ॣ	सडक बोर्ड/जलवलस सडक मरुमत कार्यक्रम	सडक मरुमक,सुधलर(गुयाबलन, सोललड, टेवल पर्खलल )	संखुया	३	३	१००	३०००
।	झोलुङुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	नलरुयमलत मरुमत,बृहत मरुमत, झुु.पु तलललम,पुल हेरललु पलरलशुरमलक	संखुया	ॢ१	ॢ१	ॢ३७ॢ	२००००
॥	युवल सलझेदलरी कार्यक्रम	लैङुगलक हलंसल वलरुद्ध जनचेतनल अभलवृदी कार्यक्रम, तलललम, कृषल वुयवसलय बलकलस, युवल सचेतनल कार्यक्रम	संखुया	ॢ	ॢ	ॢ१ॢ	२ॢॢ

# शिर्षकगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा परियोजनाको नाम	भौतिक प्रगति				खर्च	अनुमानित लाभान्वित जनसंख्या
		मुख्य गतिविधी	ईकाई	लक्ष्य	प्रगति		
१०	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	सत्तल तथा मन्दिर निर्माण र मर्मत सुधार	संख्या	२२	२१	५१४२	१३४२०
११	स्थानिय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम	मोटेरेबल पुल निर्माण	संख्या	२	२	९७४७	
१२	राजश्व बाँडफाड (बिधुत रोयल्टी, मालपोत आदी)	खा.पा. योजना, सडक निर्माण, समपुरक कोष, क्षमता बिकास कार्यक्रम, सामुदायिक भवन मर्मत तथा सुधार, पोल खरिद, साना सिचाई लगायतका कार्यक्रम ।	संख्या	९३	९३	२७८७०	३२३५०
१३	गा.वि.स. अनुदान	ग्रामिण सडक निर्माण सुधार खानेपानी, विद्युतिकरण, खेलकुद, विद्यालय भवन, खेल मैदान, लक्षित समुदाय विकास र कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।	संख्या	१३३९	१३३९	६७२७०	
१४	सामाजिक सुरक्षा	जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, आंशिक तथा पूर्ण अपांग र दलित बालबालिका पोषण कार्यक्रम अनुदान	जना	२६६५६	२६६५६	१२१२४५	२६६५६

# शिर्षकगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम तथा परियोजनाको नाम	भौतिक प्रगति				खर्च	अनुमानित लाभान्वित जनसंख्या
		मुख्य गतिविधी	ईकाई	लक्ष्य	प्रगति		
१५	LGCDP कार्यक्रम तर्फ	जिबिकोपार्जन सुधार योजना, साना पुर्वाधार निर्माण, तालिम, अभिमुखिकरण	संख्या	२४	२४	२८०३६	४००००
१६	पश्चिम नेपाल ग्रा. खा.पा. योजना तर्फ	खानेपानी योजना निर्माण, शौचालय निर्माण, तालिम, शसक्तिकरण कार्यक्रम	संख्या	३४	२२	२३३३०	११०००
१७	मर्मत सम्भार कोष	सडक मर्मत	संख्या	४२	४२	२०९५	२००००
१८	वातावरण ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम	मिनि ग्रिड,पिको हाइड्रो अनुदान वितरण तथा सिफारिस, अनुगमन, सुधारीएको चुलो प्रवर्धनका लागी संस्था परिचालन, उत्पादनशिल परिप्रयोग प्रवर्धन,	संख्या	६	६	५२८२	१६३०८

# वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम, परियोजना, अनुदान, आन्तरिक आय	विनियोजित बजेट आय रु. हजारमा	यथार्थ निकास आरु हजारमा		यथार्थ खर्च रु हजारमा		खर्च प्रतिशत
			पूजिगत	चालु	पूजिगत	चालु	
१	जिबिस अनुदान	६२७३७	२८२५४	३४४८३	२६११०.२	३२६१५.७८	९४
२	गाबिस अनुदान	९३६८८	५४४२०	२६९१०	५४४२०	२५९१०	१००
३	ग्रामिण खा.पा. तथा सरसफाइ कार्यक्रम	८३३१	५९३५	२३९६	४८४१	१४५०	७६
४	आदिबासि जनजाती उत्थान (केन्द्रिय)	२००	२००	०	२००	०	१००
५	मदेशी पिछडा वर्ग (केन्द्रिय)	१००	१००	०	०	०	१००
६	दलित बर्ग उत्थान (केन्द्रिय)	३००	३००	०	२०८	०	७०
७	आन्तरिक श्रोत(मालपोत रजिष्ट्रेशन,विधुत रोयल्टि)	५४८५२	५४८५२	-	२५८५२	२०००	५१
८	स्थानीय यातायात पूर्वाधार तथा क्षेत्रगत कार्यक्रम(पूजिगत)	१६०००	१६०००	०	१५८१५	०	९९
९	साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	७५००	७५००	०	७१३१.०	०	९६

# वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम, परियोजना, अनुदान, आन्तरिक आय	विनियोजि बजेट आय रु. हजारमा	यथार्थ निकास आरु हजारमा		यथार्थ खर्च रु हजारमा		खर्च प्रतिशत
			पूजिगत	चालु	पूजिगत	चालु	
१०	स्थानिय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम	११०००	११०००	०	९७४८	०	८९
११	आन्तरिक आय	७४४३	९४३	६५००	३४०	४८६८	७०
१२	सामाजिक सुरक्षा	१५५५७७	०	१५५५७७	०	१३०९१२	८४
१३	LGCDP कार्यक्रम	३०२४८	-	३०२४८	-	२८०३६	९३
१४	पश्चिम नेपाल ग्रा. खा.पा. योजना (म्याचिड सहित)	२६२४८	२३८२६	२३९४	१९२८९	२३९४	८३
१५	औषधि उपचार, संचित विदा)	२२४३	०	२२४३	०	२२४३	१००
१६	संस्कृति प्रबर्दन कार्यक्रम	५४००	५४००	०	५१४२	०	९५

# वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम, परियोजना, अनुदान, आन्तरिक आय	विनियोजि बजेट आय रु. हजारमा	यथार्थ निकास आरु हजारमा		यथार्थ खर्च रु हजारमा		खर्च प्रतिशत
			पूजिगत	चालु	पूजिगत	चालु	
१७	स्थानिय शान्ति समिति	५५८	५५८	०	५५८	०	१००
१८	स्थानिय निकाय बित्तिय आयोग	५०१	४३३.८१	०	४३३.८१	०	८७
१९	झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	५०००	५०००	०	३६९९.४०१	०	७४
२०	निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रम	४२०००	-	४२०००	-	३८६९१	९२.१२
२१	राष्ट्रिय युवा परिचालन	८१६	-	८१६	-	८१६	१००
२२	गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम	१२८३		१२८३	-	१२८३	१००
२३	सहकारि ग. नि. मन्त्रालय	४२४	५०	१६	-	-	०
२४	आर्थिक केन्द्र जोडने सडक	५८०२	५८०२		४८२४		८४
२५	युवा साझेदारी कार्यक्रम	६१९.२	६१९.२	०	६१९.२	०	१००
	<b>जम्मा</b>	<b>५३८९७०.२</b>	<b>२२११९२</b>	<b>३०४८६६</b>	<b>१७९२३०.६१</b>	<b>२७१२१८.७८</b>	<b>८५.६२</b>
